



Duurzame Polder

Technische infosessie

Den Bosch, 15 juni 2022



Mike van der Geld

Jacco Peter Hooiveld



Plan van aanpak

toelichting door:
Jos Pierrey, projectmanager
Duco van Dijk, omgevingsmanager



Actuele opgave

- Gemeente 's-Hertogenbosch
 - *16 Windmolens, ambitie 2030 versneld*
 - *Afstandsnorm 1 km*
 - *Doorkijk naar opgave 2045. Ambitie klimaatneutraal versneld van 2050 naar 2045*
 - *Klimaatbos ten westen Grintweg*
 - *Geen zonnevelden*
- Gemeente Oss
 - *0,514 PJ opwek*
 - *Alléén windenergie*
 - *Afstandsnorm 2 km*
 - *Doorkijk t/m 2030.*



Bestuursovereenkomst

- Eind 2021 ondertekend door beide gemeenten, provincie Noord- Brabant en het ministerie van EZK.
- Hierin staan onder meer de samenwerkingsafspraken, zoals rollen, verantwoordelijkheden, financiën en bevoegdheden beschreven.
- Een aantal belangrijke punten hieruit:
 - *Bevoegd gezag voor planvorming bij beide gemeenten!*
 - *Gemeenten richten gezamenlijke projectorganisatie in*
 - *Er wordt een plan van aanpak opgesteld*
 - *Meekoppelkansen voor klimaatadaptatie, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie worden onderzocht*



Projectopdracht

Bij de uitwerking van de voor Duurzame Polder gestelde energieopgave
(namelijk: het tijdig -uiterlijk 1 januari 2025- verlenen van vergunningen voor de beoogde opwek),
wordt de samenhang met andere waarden en belangen in ogenschouw genomen, waardoor een integrale gebiedsontwikkeling plaatsvindt



Projectopdracht

Bij de uitwerking van de voor Duurzame Polder gestelde energieopgave
(namelijk: het tijdig -uiterlijk 1 januari 2025- verlenen van vergunningen voor de beoogde opwek),
wordt de samenhang met andere waarden en belangen in ogenschouw genomen, waardoor een integrale gebiedsontwikkeling plaatsvindt



Ambities Integrale Gebiedsontwikkeling

Kansen en waarden onder meer:

- Landbouwtransitie
- Biodiversiteit en natuur
- Cultuurhistorie
- Recreatie
- Water, bodem en lucht
- Klimaatadaptatie


➤ Ontwerpend onderzoeken



Plangebied


Zoekgebied windmolens

- **Gemeente 's-Hertogenbosch:**
 - 1 kilometer afstand tot huidige bebouwde kom
- **Gemeente Oss:**
 - uitgangspunt 2 kilometer afstand tot huidige bebouwde kom

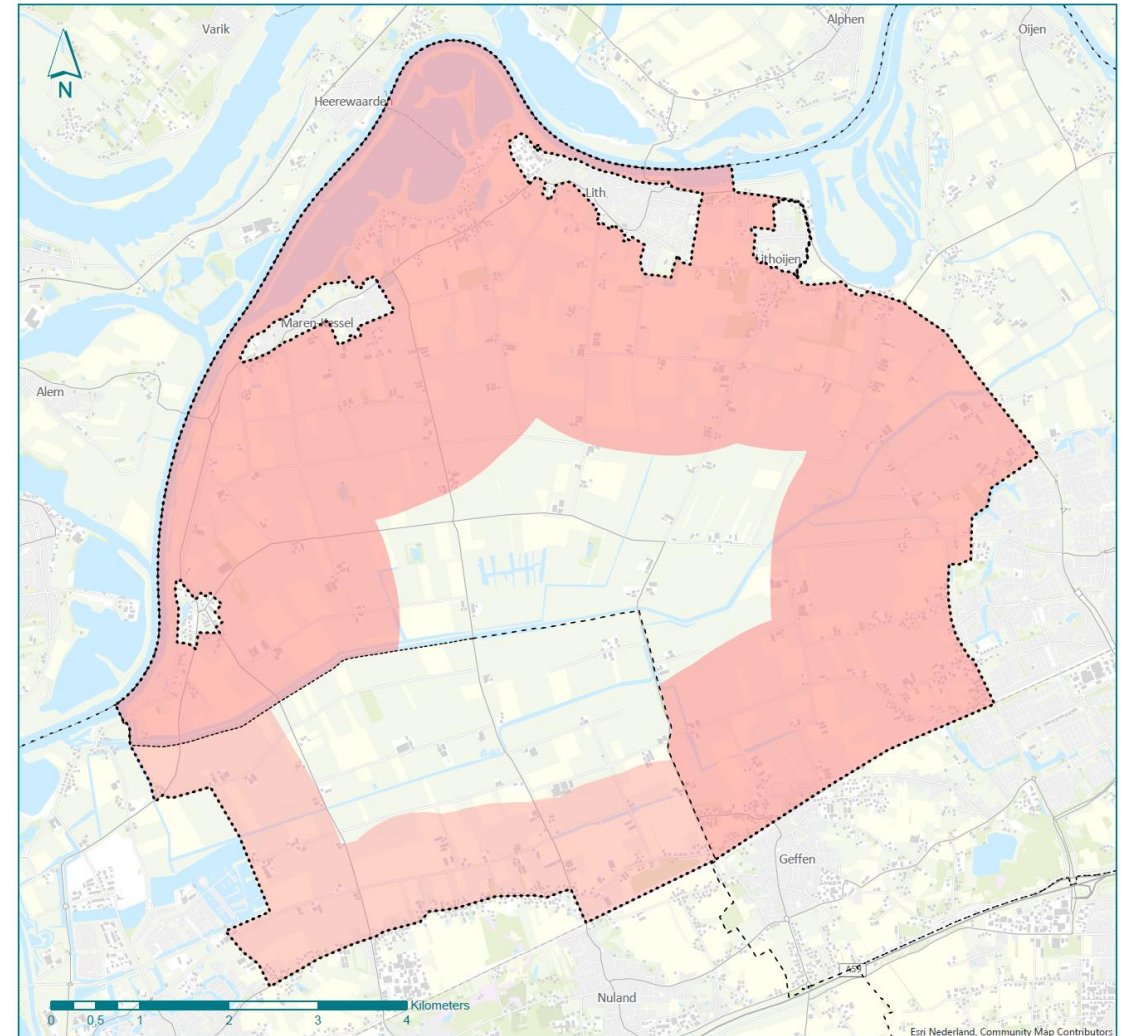


Projectfasering & Planning

- Planning: Energieopwekking: vergund < 2025 en gerealiseerd < 2030.
- Ontwerpend onderzoek en MER lopen parallel
- We starten met Plan van Aanpak en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

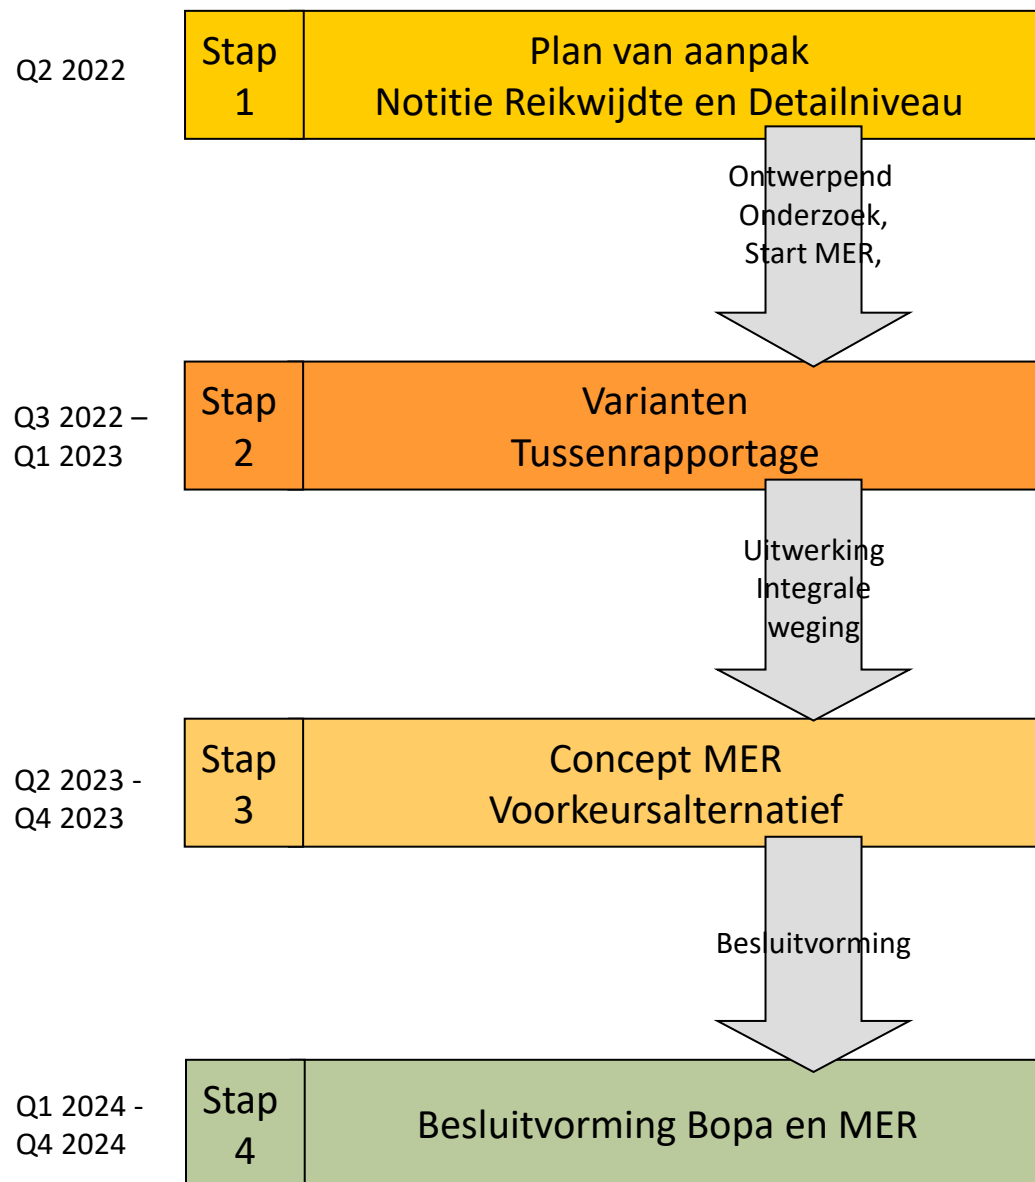


Notitie Reikwijdte en Detailniveau

- Beschrijft aanpak milieuonderzoek: *Onderzoeks agenda*
- Beschrijft te onderzoeken waarden: *Reikwijdte*
- Beschrijft diepgang: *Detailniveau*
- Beschrijft de toetsingscriteria voor de weging naar het voorkeursalternatief

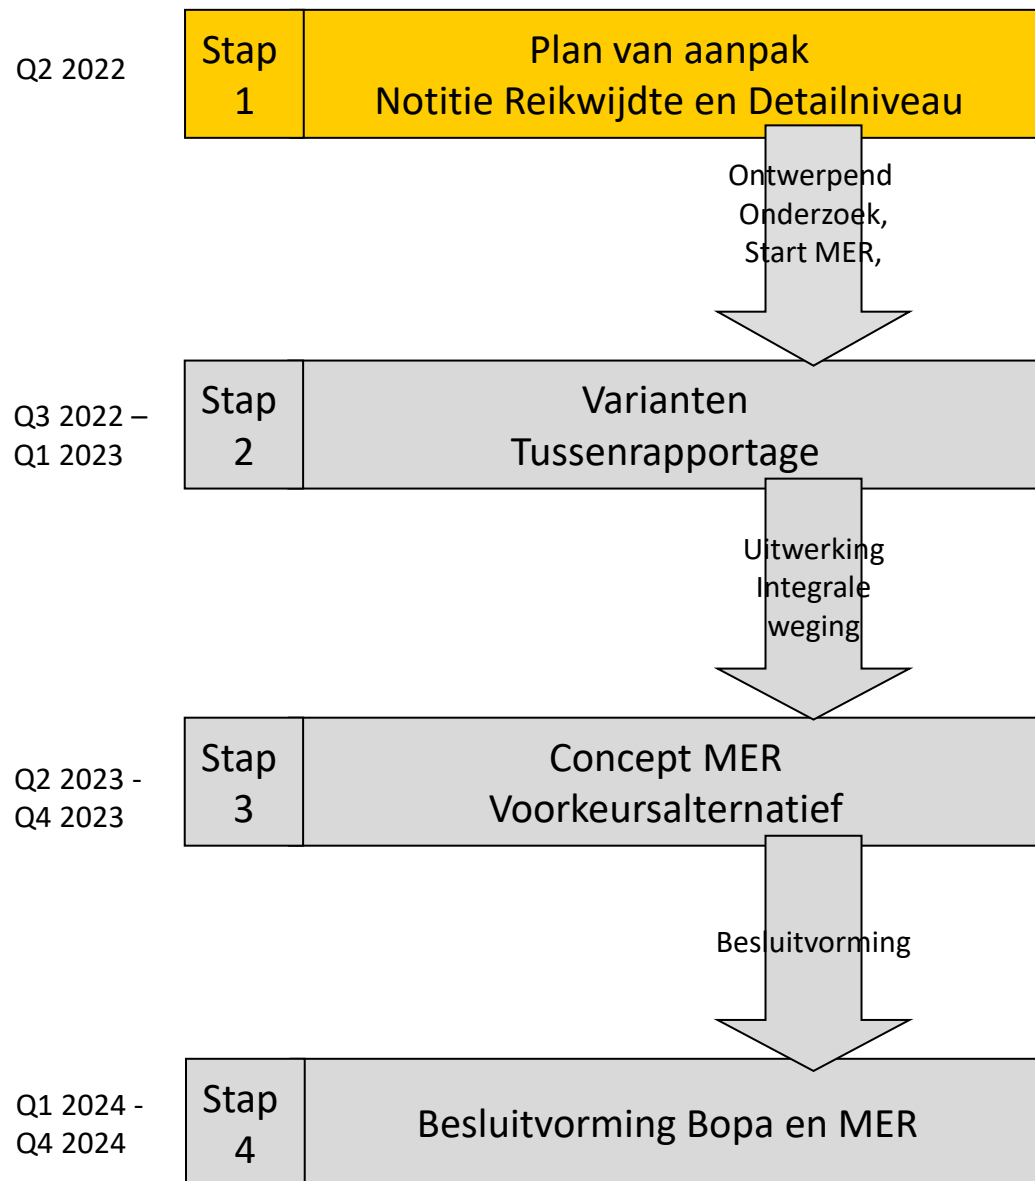


Varianten

- Beginnen met kansen en waarden
- Parallel: varianten opstellen in ontwerp- en onderzoek, milieuonderzoek
- Eén (combi) MER.

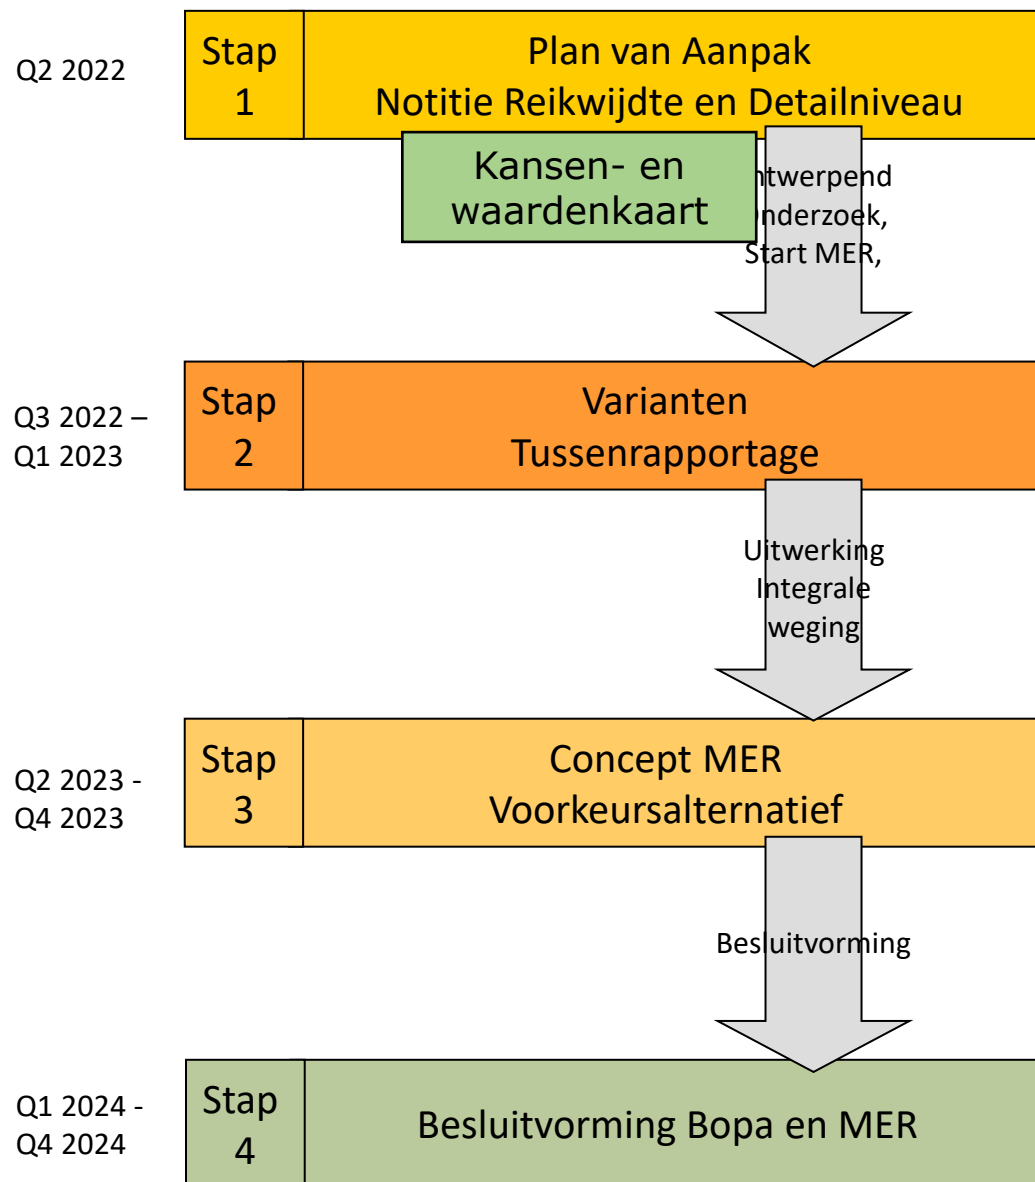


Varianten

- Beginnen met kansen en waarden
- Parallel: varianten opstellen in ontwerpend onderzoek, milieuverkenkend-onderzoek
- Eén (combi) MER.

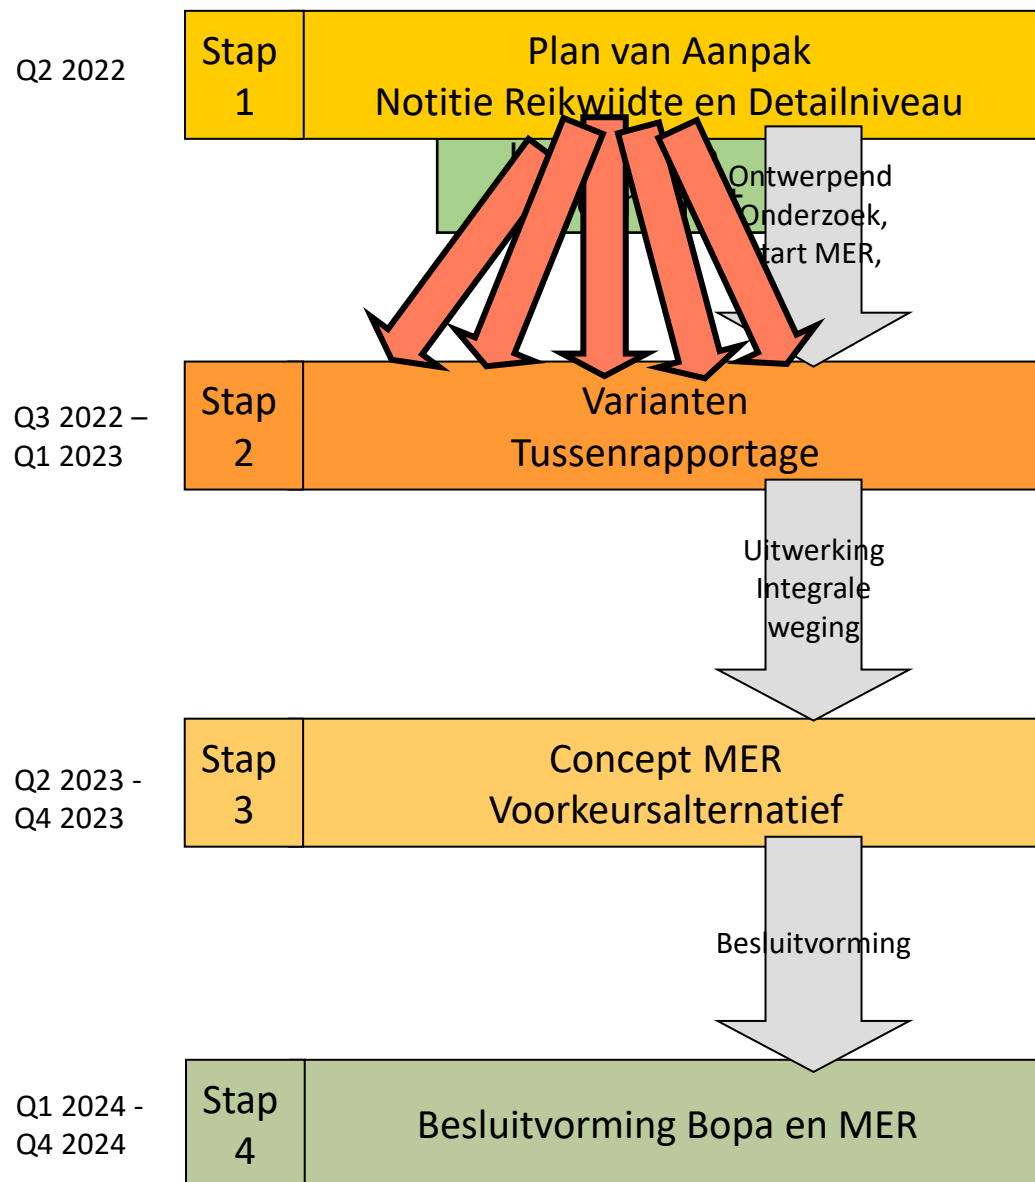


Trechteren

- Varianten toetsen en wegen: trechteren
- Toewerken naar voorkeursalternatief
- Voorkeursalternatief is integraal

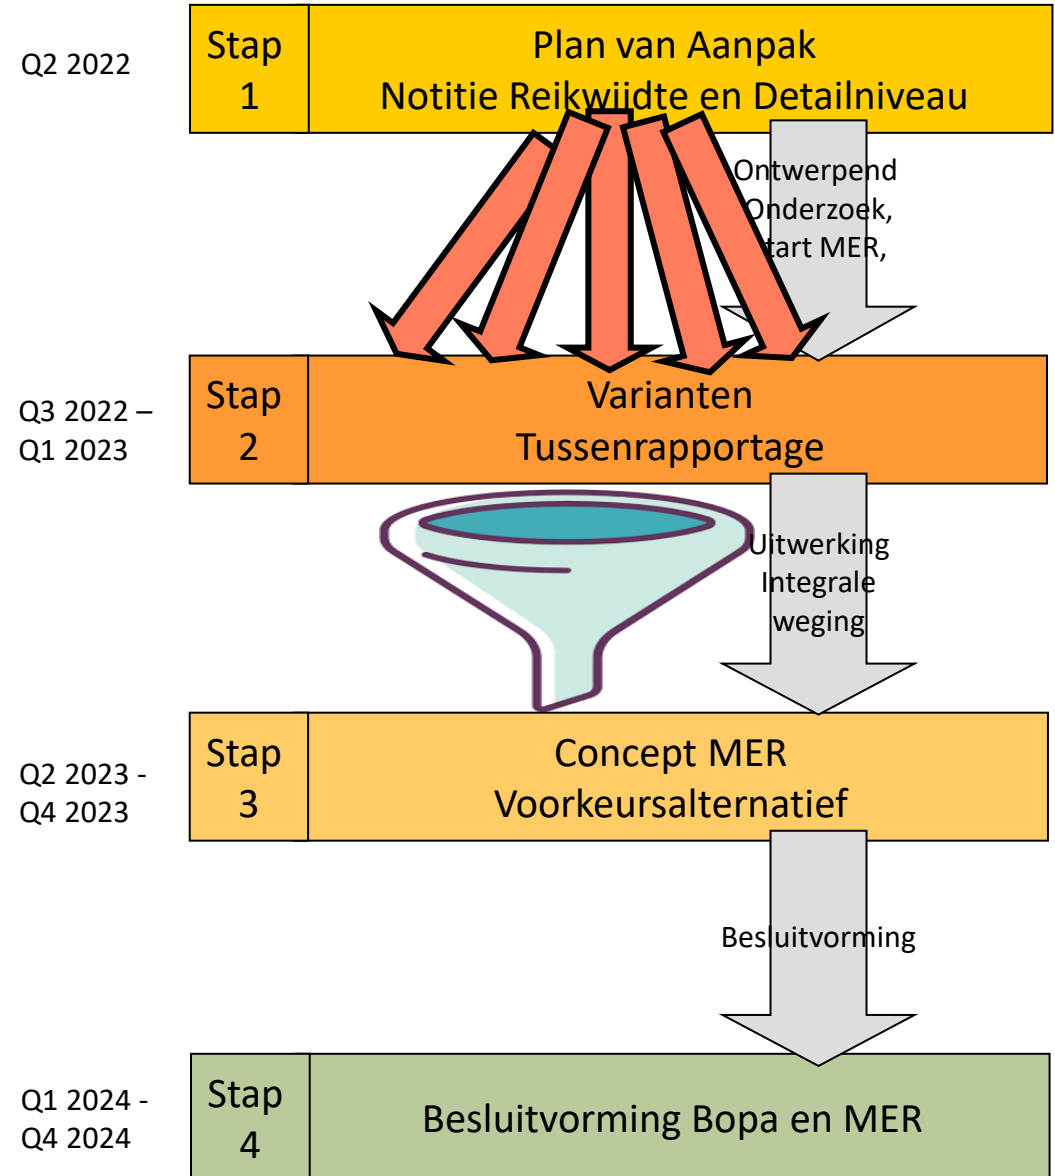

Projectfasering & Planning

- Betrokkenheid Advies Commissie MER.
- Géén Programma (instrument Omgevingswet).
- Eén (combi) MER.

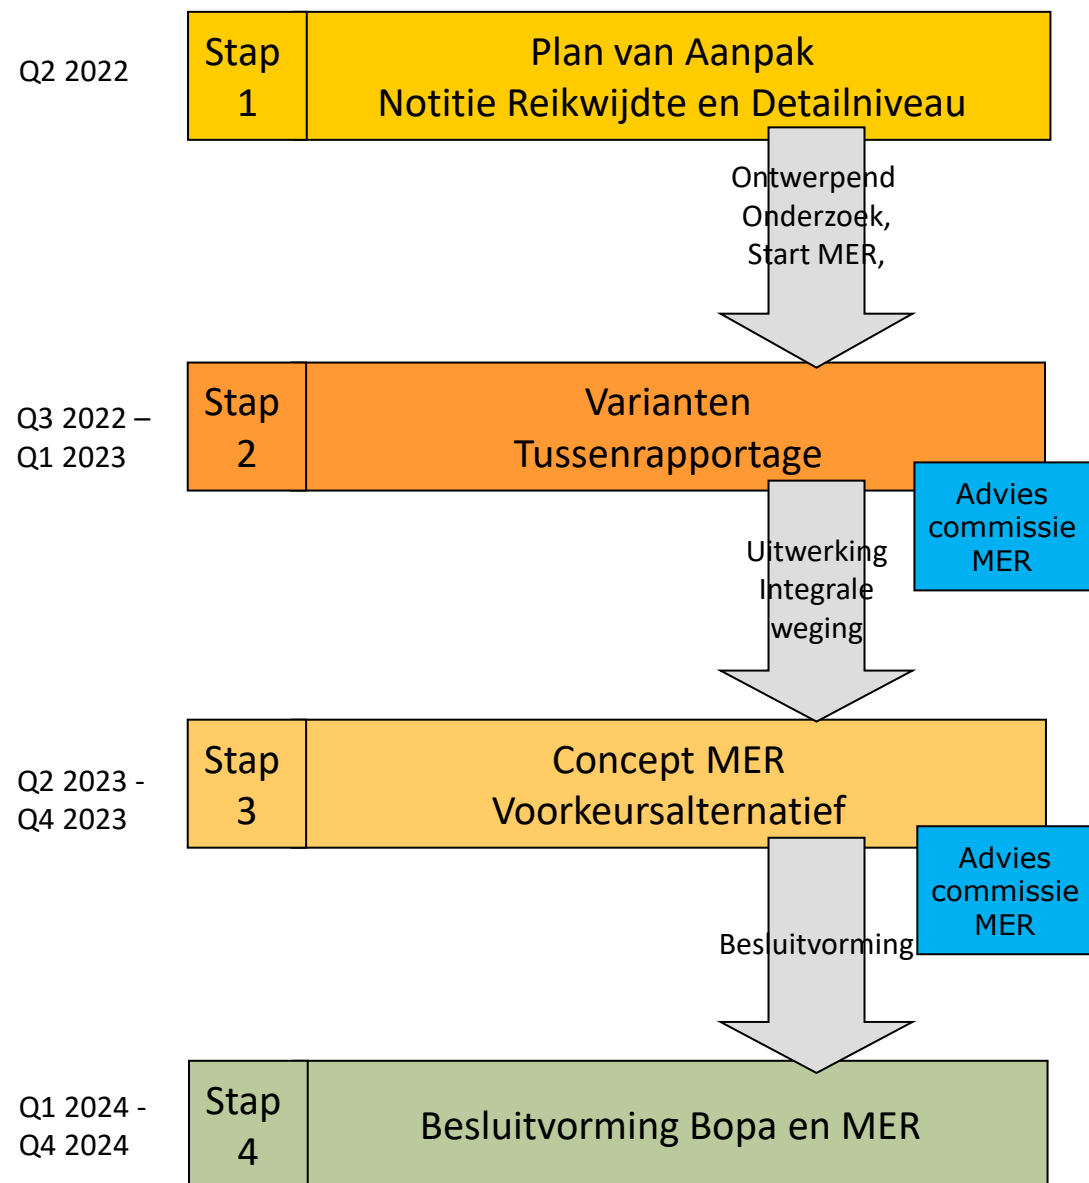

Kansen en waarden, varianten


Q2 2022

- Eerst in beeld brengen kansen en waarden
- Rapport 2^e fase verkenning is de basis.
- Aantal varianten is nog nader te bepalen.

De varianten zijn integraal: elke variant kijkt naar inpassen opwek duurzame energie in combinatie met kansen:

- Landbouwtransitie
 - Biodiversiteit en natuur
 - Cultuurhistorie
 - Recreatie
 - Water, bodem en lucht
 - Klimaatadaptatie
- In de varianten wordt gevarieerd met verschillende opstellingen en andere kansen en waarden.
 - Varianten wegen mogelijkheden om efficiënt aan te sluiten op het net.
 - Varianten worden gewogen op mogelijke milieueffecten.

Q3 2022 –
Q1 2023

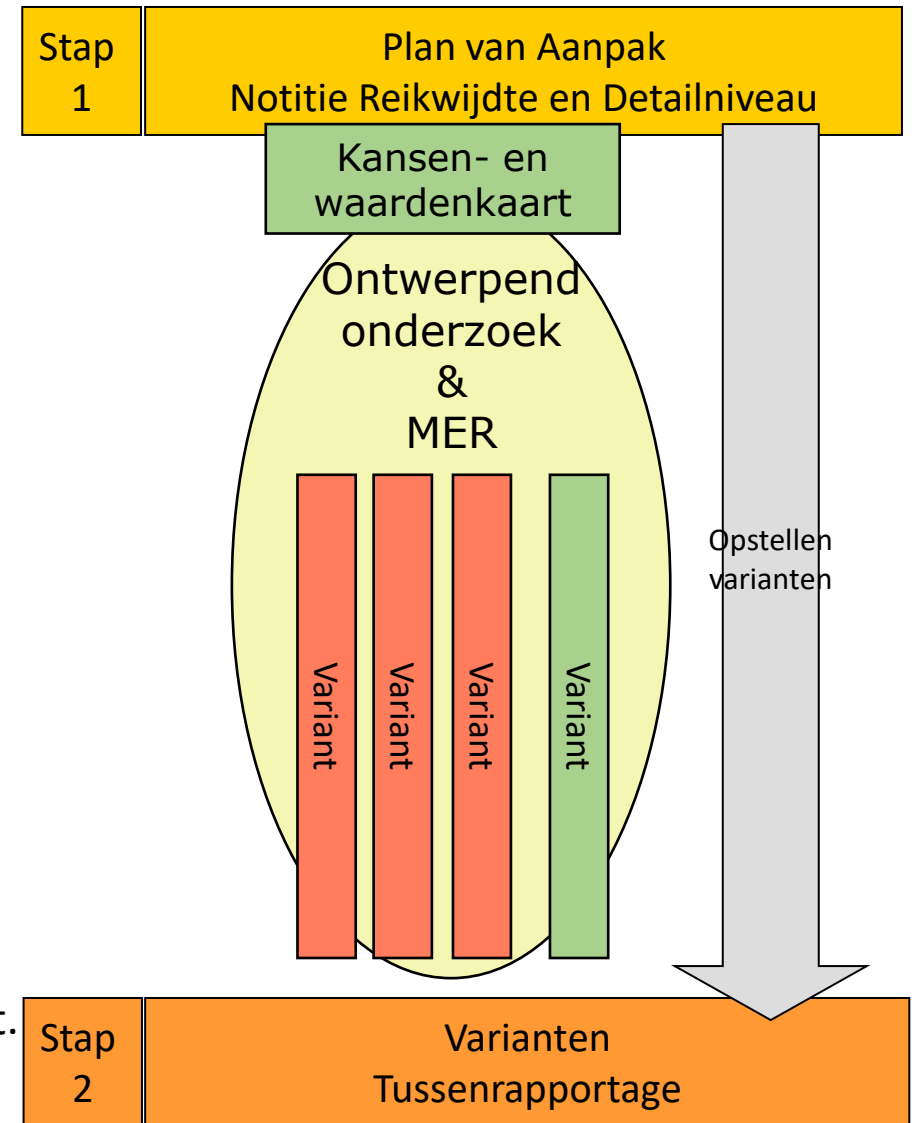




Communicatie en Omgevingsparticipatie

- Participatierondes waarbij alle belanghebbenden mee kunnen denken, onder meer met het ontwerpend onderzoek.
- Klankbordgroep (i.o.) gericht op proces, communicatie en adequate verwerking inbreng

Participatie in ontwerpend onderzoek

- Participatie van belanghebbenden bij ontwerpend onderzoek
- Iedereen met een belang in de polder kan meedoen.
- Ontwerpers bereiden input voor, presenteren en verwerken reacties.
- Besluit aanwijzen plangebied voor opwek van duurzame energie niet ter discussie.
- Verschillende behoeften van belanghebbenden
 - *Meedenken en meedoen*
 - *Input leveren, argumenten aanleveren, gas en tegengas geven*
 - *Geïnformeerd worden*
- Jeugd en jongeren betrekken!
- Na de tussenrapportage zal de participatie worden voortgezet tot aan het formuleren van een voorkeursvariant.

Q2 2022

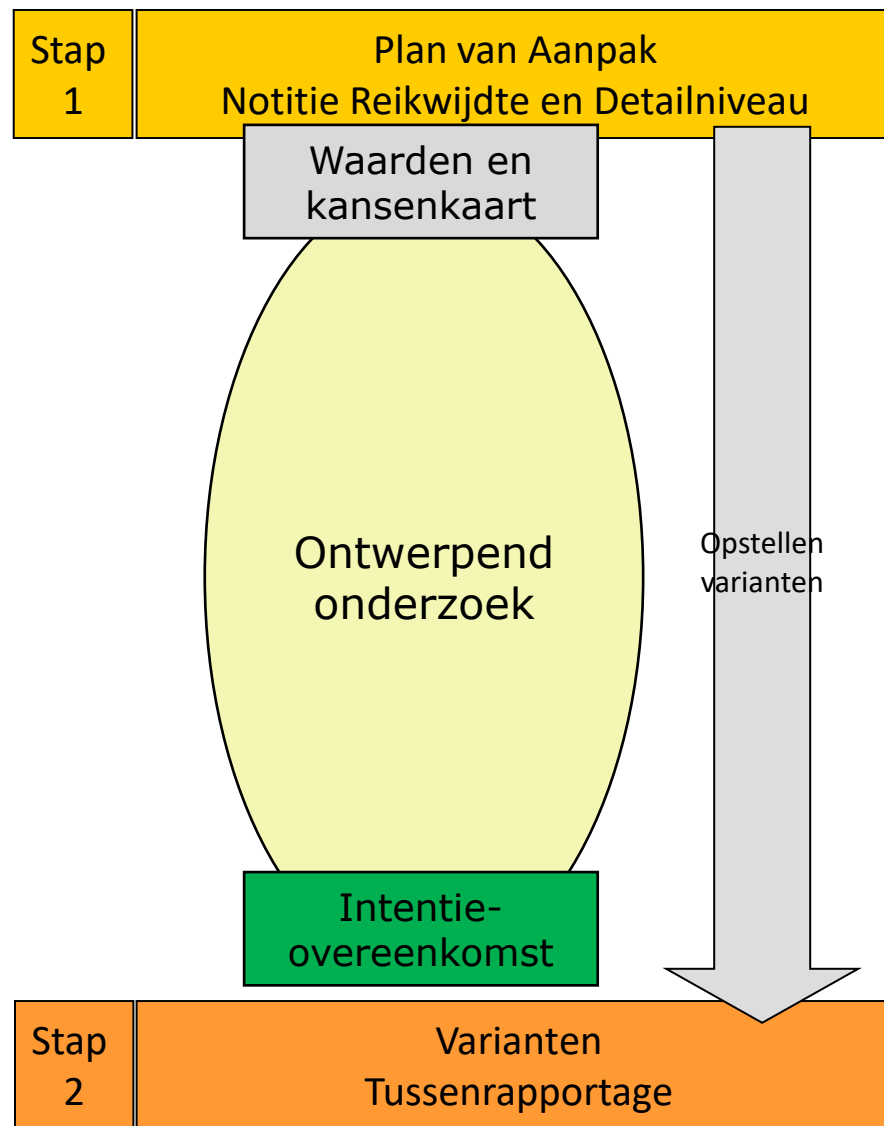


Q3 2022 –
Q1 2023

Klankbordgroep

- Denkt mee en adviseert over proces en communicatie
- Checkt verwerking van ingebrachte belangen.
- De leden brengen in:
 - *Gebiedskennis*
 - *In het gebied levende meningen*
- Besluit aanwijzen plangebied voor opwek van duurzame energie niet ter discussie.


In de klankbordgroep vertegenwoordigd belangorganisaties op het gebied van:

- *Dorps- en wijkraden (in 's Hertogenbosch en Oss)*
- *Bewonersgroepen (Groen in Zicht en Behoud Lithse Polder)*
- *Grondeigenaren/Initiatiefnemers (uit Oss en den Bosch)*
- *Belangenorganisaties op het gebied van o.m. landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie*
- Inmiddels twee keer bijeengekomen

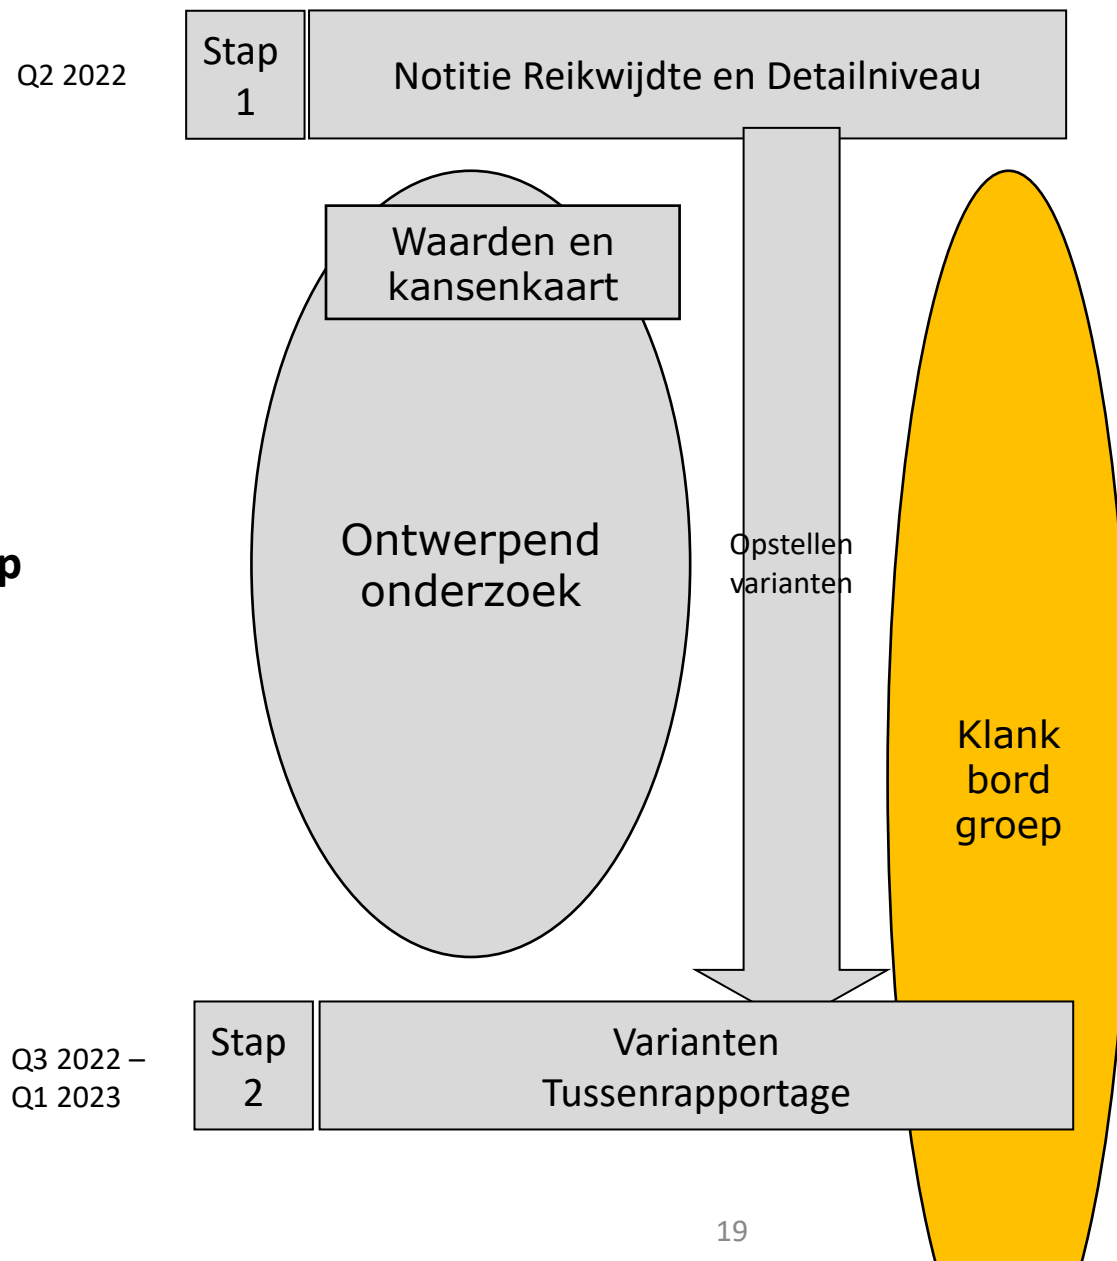

Betrokkenheid gemeenteraden

- Q2 2022
NRD ter informatie/bespreking gemeenteraden
- Q1-Q2 2023
Bespreken tussenrapportage in beide gemeenteraden
- Q4 2023
Concept MER en Voorkeursalternatief besluitvorming in beide gemeenteraden
- 2024
Vergunningverlening bespreken in beide gemeenteraden (bindend advies)

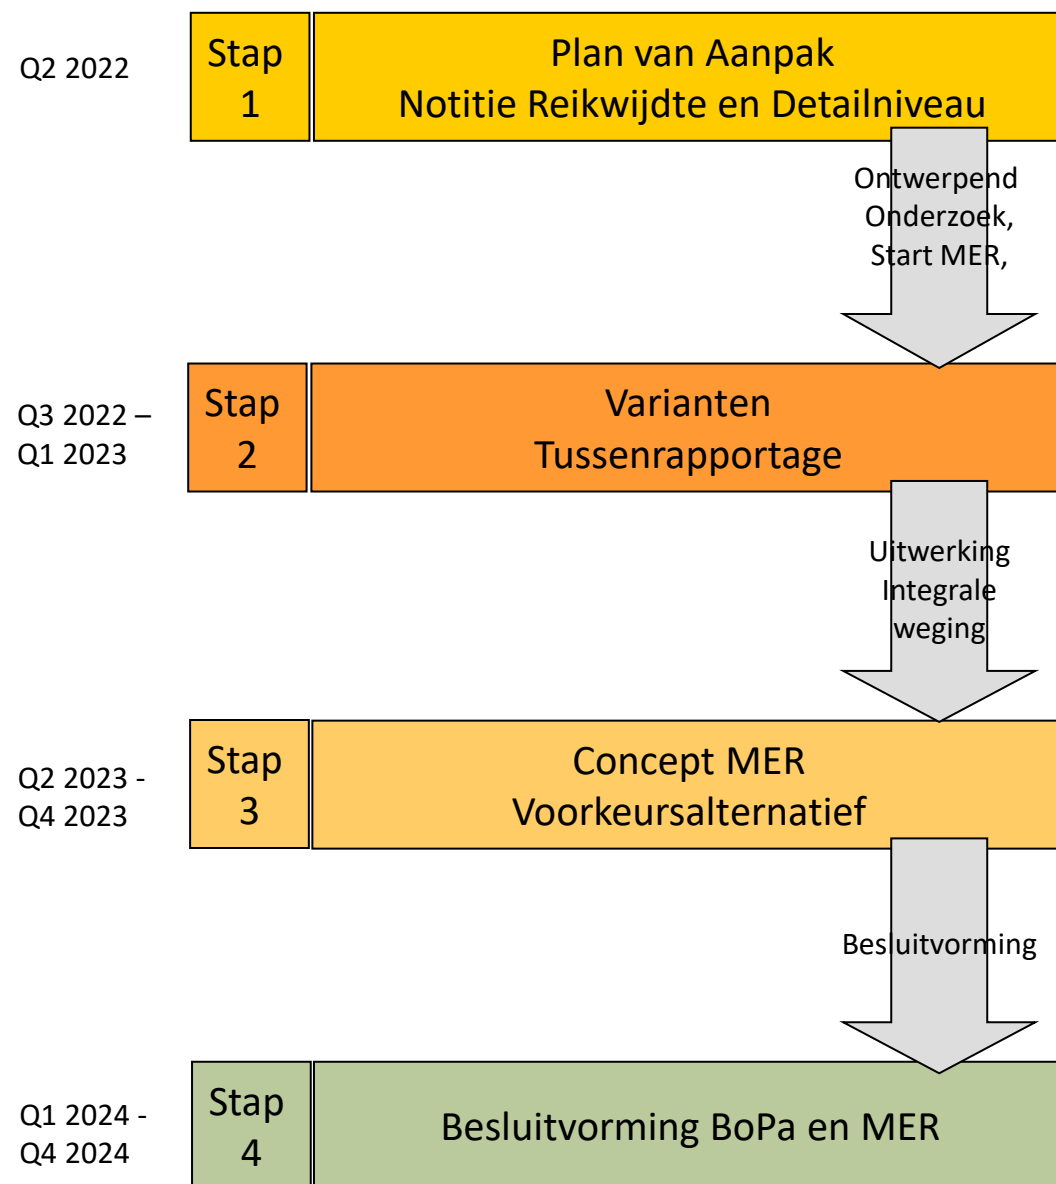




Initiatiefnemers voor wind

- **Initiatiefnemers wind in Oss en 's Hertogenbosch :**
 - Windcollectief Oss-Den Bosch
 - Windpark Den Bosch
- **Financiële participatie:**
 - Streven naar 50% mede eigendom
 - Gebiedsfonds
- **Intentie- en anterieure overeenkomsten:**
 - Uitgangspunt 1: zo veel mogelijk (plan)kosten van windturbines verhalen op initiatiefnemers;
 - Uitgangspunt 2: deze voor vergunningverlening vastleggen in intentie- en anterieure overeenkomsten.



Organisatie: Stuurgroep

- Bestuurlijk opdrachtgever: Bart Krol
- Gedeputeerde: Annemarie Spierings
- Wethouder Oss: Jacco Peter Hooiveld
- Wethouder 's-Hertogenbosch: Mike van der Geld

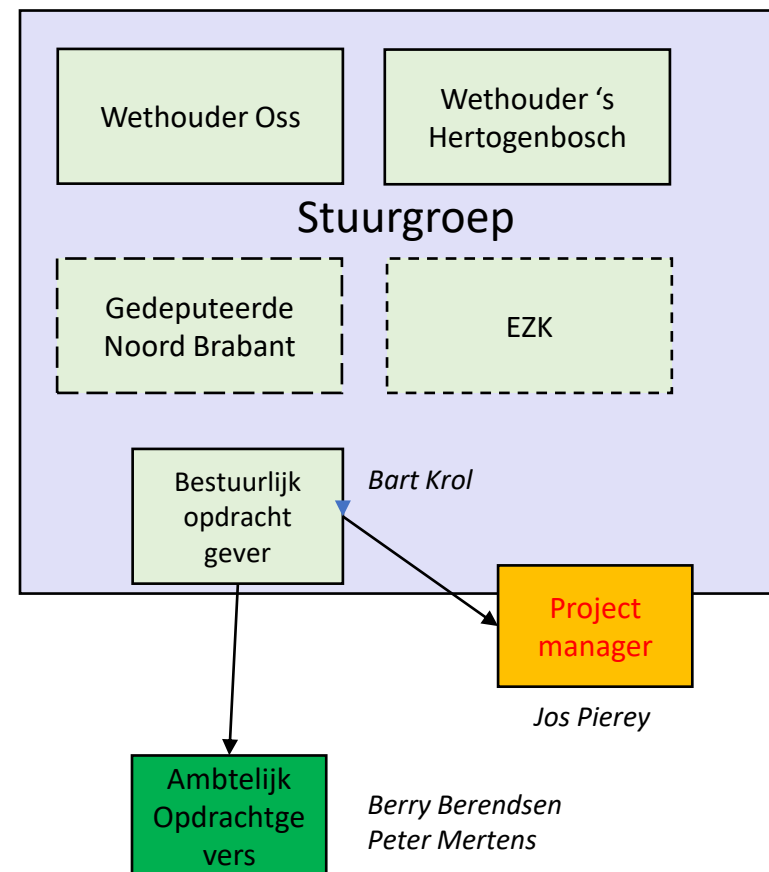



Spelregels

- De partners verbinden zich **open** met elkaar te **communiceren**, elkaar op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen, bezwaren worden onverwijld geuit
- Het **besluit van de gemeenteraden** om het plangebied aan te wijzen voor de opwek van duurzame energie staat **niet ter discussie**.
- De planning van het **plan van aanpak** is voor alle partners **leidend**. Noodzakelijke aanvullende onderzoeken worden zo vroeg mogelijk geformuleerd opdat ze ingepast worden in deze planning, zodat de beoogde deadline niet nodeloos in gevaar komt.
- De vertegenwoordigers in de stuurgroep en de bestuurlijke afstemming **informer**en tussentijds hun colleges, en informeren indien noodzakelijk tussentijds hun raden en staten. De projectorganisatie kan daarbij assisteren.
- De ambtelijke vertegenwoordigers in de projectgroep/klankbordgroep **informer**en tussentijds hun eigen organisaties en hun eigen besturen.
- De scope van de werkzaamheden is bepaald door de **randvoorwaarden** die door de beide gemeenteraden zijn geformuleerd, in termen van te behalen opwek, in acht te nemen afstanden, integrale ontwikkeling, de geformuleerde tijdlijn en deadlines, de gewenste communicatie en participatie en de beschikbare middelen.
